



滇禄地3井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心


起止时间：2016年11月2日07:00~2016年11月3日07:00

井点地理位置	云南省禄劝县撒营盘镇芝兰村境内		构造位置	深沟拉复向斜东部隐伏断背斜构造高点				
目的层段	上三叠统舍资组		设计井深 (m)	1500				
钻井施工情况								
施工累计天数	17	当前井深 (m)	215.83	日进尺 (m)	23.12			
钻遇地层	中侏罗统张河组	垂深 (m)	/	钻头规范 (mm)	110.0			
施工情况	工程简况: 7:00-8:20, 7:00, 正常钻进;							
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	/				
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.02	1.05	粘度 (s)	25.00			
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm ²)	/			
	温度 (°C)	/	/	终切 (mg/cm ²)	/			
	失水 (mL)	6	含砂 (%)	1.50.5	PH值	8		
录井资料								
岩性	紫红色厚层状泥岩间夹灰色-灰绿色薄层状泥灰岩							
异常显示	/							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0-0.015			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	/	/	/	/	/	/	/	
地化录井	岩性							
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/	最大	最小	一般	
取心情况	全井取心		钻时 (min/m)	/	/	/	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)			

滇禄地3井现场照片

第60箱

第61箱

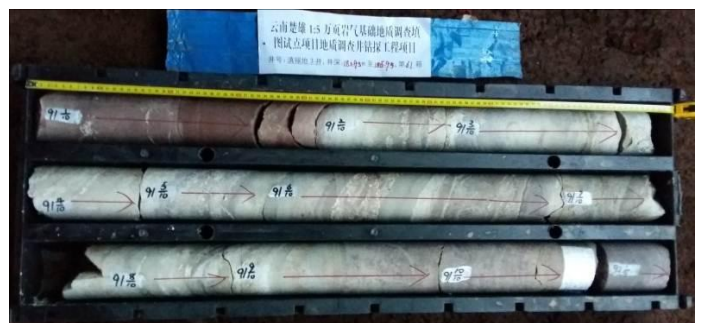

汇报人：刘文辉

2016年11月3日
