

贵州安龙地区页岩气地质调查井黔兴地1井钻探工程地质日报




编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年11月7日20:00~2016年11月8日20:00

井点地理位置	贵州兴仁县大桥河三道坑		构造位置	典母背斜翼部				
目的层段	上二叠统龙潭组		设计井深 (m)	1500m				
钻井施工情况								
施工累计天数	18	当前井深 (m)	262.79	日进尺 (m)	18.00			
钻遇地层	永宁镇组第三段	垂 深 (m)	/	钻头规范 (mm)	77.0			
施工情况	2016.11.7日20:00-8日08:00停钻，国土资源厅办手续；08:00-10:00配制泥浆；10:00-10:30下钻扫孔；10:30-20:00正常取芯钻进至井深262.79m							
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	/				
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.01	1.02	粘度 (s)	20			
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm ²)	/			
	温度 (°C)	11	12	终切 (mg/cm ²)	/			
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	0.2	PH值	7		
录井资料								
岩 性	灰色块状灰岩、白云质灰岩							
异常显示	无							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.003-0.013			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0-0.004	0	0	0	0	0	0	
地化录井	岩性							
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/		最大	最小	一般
取心情况	岩心采取率	100.00	%	钻时 (min/m)	40	27	10	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩 性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	/	
	/	/		/		/		
	/	/		/		/		

黔兴地1井现场照片

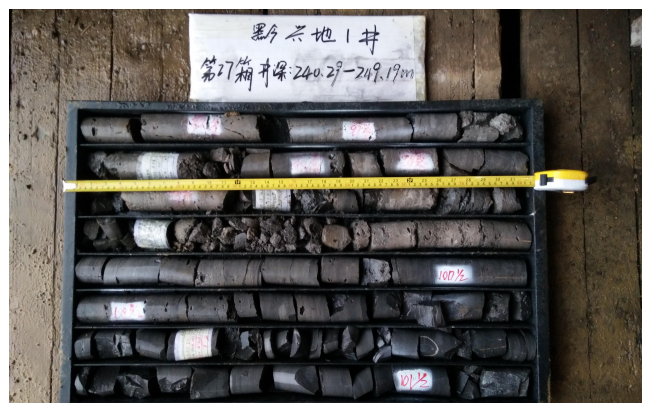

汇报人：祁顺利

审核人：张子亚

2016年11月8日
