
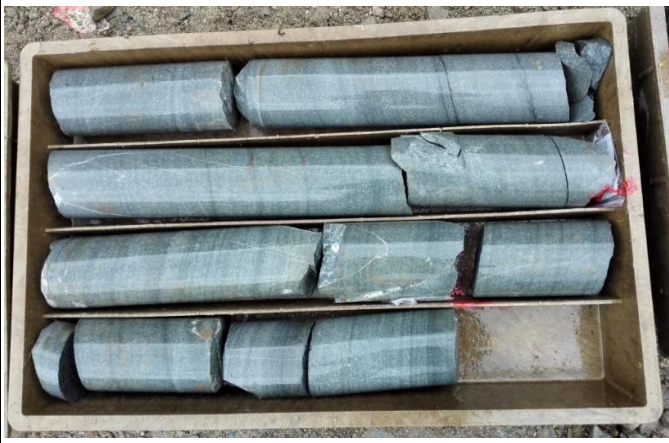




# 鄂秭地4井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年11月21日07:00至11月22日07:00

井点地理位置	湖北省宜昌市秭归县砖屋岭村		构造位置	秭归盆地西南翼		
目的层段	上三叠统沙镇溪组/下侏罗统香溪组		设计井深 (m)	1780		
<b>钻井施工情况</b>						
施工累计天数	10	当前井深 (m)	103.27	日进尺 (m)	16.76	
钻遇地层	沙溪庙组上段	垂深 (m)	103.27	钻头规范 (mm)	130.00	
施工情况	07:00-07:00, 正常钻进。					
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	/		
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.01	1.02	粘度 (s)	19	
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/	
	温度 (°C)	21	21	终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/	
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	/	PH值	9
<b>录井资料</b>						
岩性	灰绿色中砂岩					
异常显示	无异常					
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.000	
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	
	0.000	0.000	0.000	0.000	/	
地化录井	岩性					
	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	
	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描			伽马扫描		
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/	最大	最小
取心情况	取心16.76m, 收获率为100%		钻时 (min/m)	106.00	55.00	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
鄂秭地4井施工现场			钻井岩心照片			
						

汇报人：张肇鹏

审核人：张瑞；孟凡洋

填报日期：2016年11月22日
