
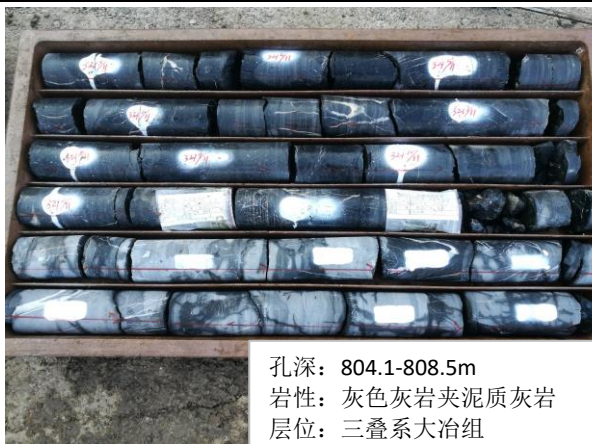




鄂五地2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2018年10月5日07:00~2018年10月6日07:00

井点地理位置	湖北省宜昌市五峰县仁和坪镇升子坪村							
构造位置	仁和坪向斜	设计井深 (m)	1500.00					
钻井施工情况								
施工累计天数	54	当前井深 (m)	810.00	日进尺 (m)	14.10			
钻遇地层	三叠系大冶组	垂深 (m)	810.00	钻头规范 (mm)	98.00			
施工情况	--19:00正常钻进, -23:00起钻换钻头, --07:00正常钻进。							
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	/			
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.03	1.02	粘度 (s)	25			
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm ²)	/			
	温度 (°C)			终切 (mg/cm ²)	/			
	失水 (mL)		含砂 (%)		PH值	9		
录井资料								
岩性	灰色-深灰色中-厚层状灰岩夹泥质灰岩, 裂缝发育, 局部方解石充填							
异常情况	无							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.09-3.17			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.05-2.80	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/		最大	最小	一般
取心情况	14.1m		常规钻时 (min/m)	/			/	
			取心钻时 (min/m)	/	/	/	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)		/	
现场施工照片				岩心/岩屑照片				
								
				孔深：804.1-808.5m 岩性：灰色灰岩夹泥质灰岩 层位：三叠系大冶组				

填报人：杜江

审核人：李浩涵

日期：2018年10月6日

