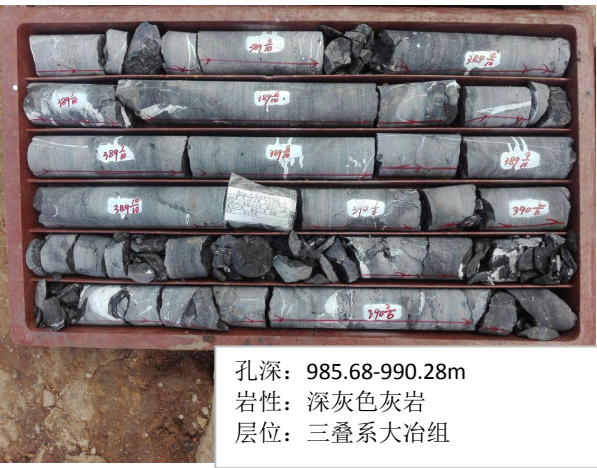


# 鄂五地2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2018年10月17日07:00~2018年10月18日07:00

井点地理位置	湖北省宜昌市五峰县仁和坪镇升子坪村							
构造位置	仁和坪向斜	设计井深 (m)	1500.00					
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	66	当前井深 (m)	991.00	日进尺 (m)	0.00			
钻遇地层	三叠系大冶组	垂 深 (m)	991.00	钻头规范 (mm)	98.00			
施工情况	-07: 00综合测井, 局部岩芯破碎, 测井缓慢。							
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	/				
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	/	/	粘度 (s)	/			
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	温度 (°C)			终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	失水 (mL)		含砂 (%)	PH值	/			
<b>录井资料</b>								
岩 性	中厚层状深灰色灰岩夹少量灰黑色中层状泥质灰岩, 节理裂隙发育, 方解石脉充填。							
异常情况	无							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	/			
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/		最大	最小	一般
取心情况	0m		常规钻时 (min/m)	/		/	/	
			取心钻时 (min/m)	/		/	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩 性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/	/	
现场施工照片				岩心/岩屑照片				
								
				孔深: 985.68-990.28m 岩性: 深灰色灰岩 层位: 三叠系大冶组				

填报人：杜江

审核人：李浩涵

日期：2018年10月18日
