


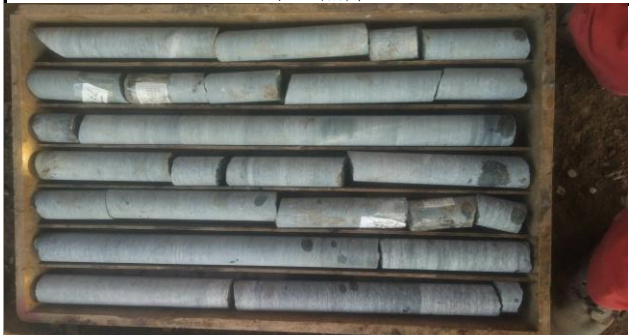


黑宝地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年11月23日08:00~2018年11月24日8:00

井点地理位置	黑龙江省双鸭山市宝清县朝阳乡		构造位置	三江盆地前进坳陷		填报人	
目的层段	石炭系珍子山组		设计井深 (m)	1650.00			
钻井施工情况							
施工累计天数	96	当前井深 (m)	1202.90	日进尺 (m)	15.00		
钻遇地层	珍子山组	垂深 (m)	/	钻头规范 (mm)	Φ80		
施工情况	取心钻进						
钻井液性能	入口	1.05	出口	1.09	泥饼 (mm)	1	
	泥浆密度 (g/cm ³)		粘度 (s)		初切 (mg/cm ²)	30.0	
	电导率 (s/m)	0.4	0.1		终切 (mg/cm ²)	/	
	温度 (°C)	11	18		PH值	/	
	失水 (mL)	8	含砂 (%)	0.03		8	
钻具结构	Φ80mm取心钻头+Φ80.5mm扩孔器+Φ75mm岩心管+Φ80.5mm扩孔器+Φ73mm钻杆+方钻杆						
测点深度 (m)	/	井斜°	/	方位°	/		
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	11:55:00	扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	5:00:00
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管		辅助	7:05:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	浅灰色-深灰色角岩化粉细砂岩						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)		/	总烃 (%)	0.008-0.085	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	
	0.002-0.011	0	0	0	0	0	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	
取心情况	取心进尺15.00m, 心长15.00m, 采取率100%。						
常规钻时 (min/m)	最大	60.0	最小	38.0	一般	45.00	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/		/	
		/		/		/	
岩心照片			岩心照片				
							

汇报人：王丹丹、刘旭锋

审核人：张文浩

日期：2018年11月24日

