
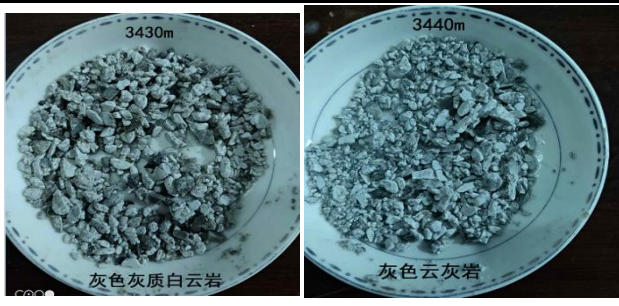




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年10月31日08:00~2019年11月1日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4200m			
钻井施工情况							
施工累计天数	77	当前井深 (m)	3446.00	日进尺 (m)	58.00	王玉龙	
钻遇地层	奥陶系蓬莱坝组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	311.2		
施工情况	8:00-19:00控时钻进-21:30循环-1:00短起下17柱-8:00控时钻进至3446m						
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.2	
			泥浆密度 (g/cm ³)	1.14	粘度 (s)	44	
			电导率 (s/m)	9.2	初切 (mg/cm ²)	2.5	
			温度 (°C)	53	终切 (mg/cm ²)	5.5	
		失水 (mL)	4.8	含砂 (%)	0.3	PH值	9
钻具结构	Φ311.2mm钻头+Φ244mm1°单弯螺杆+浮阀+定向接头+203.2无磁钻铤1根+Φ308mm扶正器+Φ203.2mm钻铤5根+631*410+Φ177.8mm钻铤×8根+Φ127mm加重钻杆8根+Φ127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	16:00:00	扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻	3:30:00	循环钻井液	2:30:00		修理	
	接单根	1:00:00	地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等待	
	固井/下套管		辅助	1:00:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	3386-3444m灰色白云质灰岩、云灰岩、灰质白云岩						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	58	岩屑捞至井深 (m)		3444.00	总烃 (%)	0.090	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.0147	0.0337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	0.0028	0.0412	0.2464	477.0	0.2904	0.1419	0.1515
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	21.0	最小	11.0	一般	16.0	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：孙鹏、赵兴鹏

审核人：张远银

日期：2019年11月1日
