


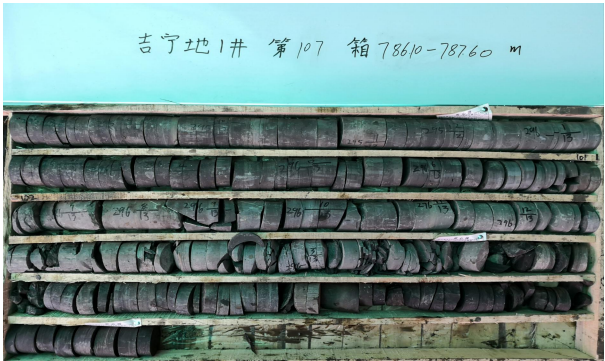

吉宁地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月09日08:00 ~ 2019年11月10日 8:00

井点地理位置	松原市宁江区伯都乡稻田队2km处		构造位置	松辽盆地中央凹陷区		填报人		
目的层段	白垩系上统嫩江组一、二段、青山口组一段		设计井深 (m)	1500		代登亮		
钻井施工情况								
施工累计天数	44	当前井深 (m)	787.60	当日进尺 (m)	1.50			
钻遇地层	嫩江组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	φ99	代登亮		
施工情况	起下钻，换钻头，下钻扫孔；正常钻进；人员安全。							
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	0.5		
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.02		粘度 (s)	46		
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm ²)			
	温度 (°C)				终切 (mg/cm ²)			
失水 (mL)		7	含砂 (%)	0.40	PH值	8.5		
钻具结构	99mm钻头+91mm钻具+钻杆					曹昊森		
测点深度	井斜	方位	位移					
时效分析								
生产时间	纯钻进	4h10m	扩划眼	非生产时间	事故			
	起下钻	15h30m	循环钻井液		修理			
	接单根	3h50m	地质循环		组织停工			
	换钻头	30m	测井/测斜		其他情况			
	固井/下套管		试压		等甲方指令			
录井资料								
岩性	深灰色泥页岩					代登亮		
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			总烃 (%)				
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅
取心情况	786.1-787.6m, 岩性为深灰色泥页岩, 岩心长1.4m, 进尺长1.5m, 岩心收获率为93.33%。工程总进尺787.6m, 岩心总长为644.8m, 岩心总收获率为81.9%。							
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)		/	
		/		/			/	
		/		/			/	
岩心照片 (786.1-787.6m)								
								

汇报人：代登亮

审核人：徐银波

日期：2019年11月10日
