
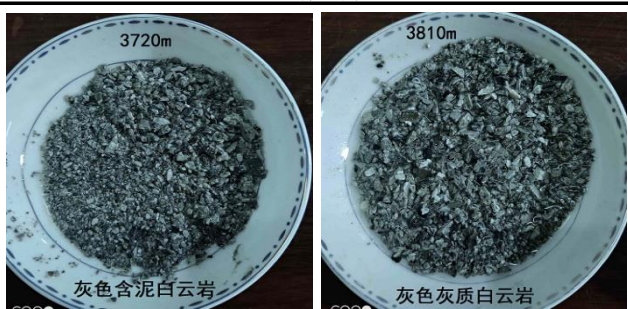




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月11日08:00~2019年11月12日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4200m			
钻井施工情况							
施工累计天数	88	当前井深 (m)	3826.00	日进尺 (m)	109.00	王玉龙	
钻遇地层	寒武系下丘里塔格组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	311.2		
施工情况	8:00-8:00钻进至3826m						
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	0.2	
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.14		粘度 (s)	44	
	电导率 (s/m)		9.3		初切 (mg/cm ²)	2	
	温度 (°C)		53		终切 (mg/cm ²)	6	
失水 (mL)		4.8	含砂 (%)	0.3	PH值	9	
钻具结构	Φ311.2mm钻头+Φ216mm1.25°单弯螺杆+浮阀+定向接头+203.2无磁钻铤1根+Φ308mm扶正器+Φ203.2mm钻铤5根+631*410+Φ177.8mm钻铤×8根+Φ127mm加重钻杆8根+Φ127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	21:00:00	扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根	1:00:00	地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜	1:00:00		等停	
	固井/下套管		辅助	1:00:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	3713-3817m灰色含泥云岩、灰质白云岩						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	104	岩屑捞至井深 (m)		3817.00	总烃 (%)	0.212	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.1165	0.0093	0.0025	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	0.0076	0.0782	0.2568	467.0	0.3426	0.2283	0.2504
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	30.0	最小	8.0	一般	11.0	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：孙鹏、赵兴鹏

审核人：张远银

日期：2019年11月12日
