


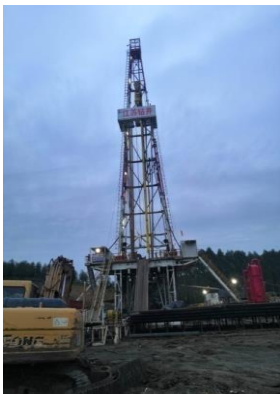

桂融页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2019年12月14日 08:00 ~ 2019年12月15日 08:00

井点地理位置	广西柳州市融安县南部						
构造位置	华南板块扬子陆块桂北地块东南缘、江南古陆的西南端，雪峰山隆起南翼柳州斜坡带沙坪复向斜			设计井深(m)	3300.00		
钻井施工情况							
施工天数	66	当前井深(m)	1670.00	日进尺(m)	/		
钻遇地层	尧云岭组	垂深(m)	1670.00	钻头(mm)	/		
施工情况	08:00-12:00起钻通井完-15:00下套管准备-02:00下技术套管完-08:00循环，等固井。						
泥浆性能			入口	出口	泥饼(mm)	0.5	
	钻井液密度(g/cm ³)		1.12	1.12	粘度(s)	60	
	电导率(s/m)		276	265	初切(mg/cm ²)	3	
	温度(℃)		37	40	终切(g/cm ²)	9	
	失水	5.0	含砂(%)	0.2	PH值	10	
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
捞取岩屑包数	0.0	岩屑捞至井深(m)	1670.00	总烃(%)	/		
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
地化录井	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (℃)	GPI	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)
	/	/	/	/	/	/	/
元素扫描	Fe(%)	/	Ca(%)	/	P(%)	/	
	AL(%)	/	K(%)	/	S(%)	/	
	Si(%)	/	Mg(%)	/	Cl(%)	/	
	Mn(%)	/	Ti(%)	/			
取心情况	/			常规钻时(min/m)	/	/	/
				取心钻时(min/m)			
现场施工照片				钻井岩心/岩屑照片			
							

汇报人：邓智超、胡彦林

审核人：明德建、王曹生

复核人：覃英伦

日期：2019年12月15日
