



阳页1井钻探工程地质日报


编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年5月15日00:00~2016年5月15日24:00

井点地理位置	湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇					
构造位置	黄陵背斜南翼		设计井深（m）	3230.00		
钻井施工情况						
施工累计天数	15.29	当前井深（m）	1385.00	日进尺（m）	41.00	
钻遇地层	∈2q	垂 深（m）	/	钻头规范（mm）	406.40	
施 工 情 况	0:00-1:00起钻-2:00甩螺杆、组钻具、调试定向仪器-9:00下钻-10:30更换水龙头带密封圈-13:45复合钻进至1353.00m-14:45维修泥浆泵-24:00复合钻进至1385.00m					
钻 井 液 性 能			入 口	出 口	泥 饼（mm）	
	泥浆密度（g/cm ³ ）		1.09	1.1	粘 度（s）	50
	电导率（s/m）				初 切（mg/cm ² ）	
	温 度（℃）				终 切（mg/cm ² ）	
	失水（mL）		含砂（%）		PH值	/

录井资料

岩 性	浅灰色、灰白色白云岩；灰色含泥白云岩							
异常情况	/							
捞取岩屑包数	41		岩屑捞至井深（m）		1385.00		总烃（%）	0.0700
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅
	0.0370	/	/	/	/		/	/
元素扫描	元素扫描						伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/	最大		最小	一般
取心情况	/			常规钻时（min/m）		32.0000	10.0000	16.0000
				取心钻时（min/m）		/	/	/
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩 性	/			解吸气含量（m ³ /吨）	/

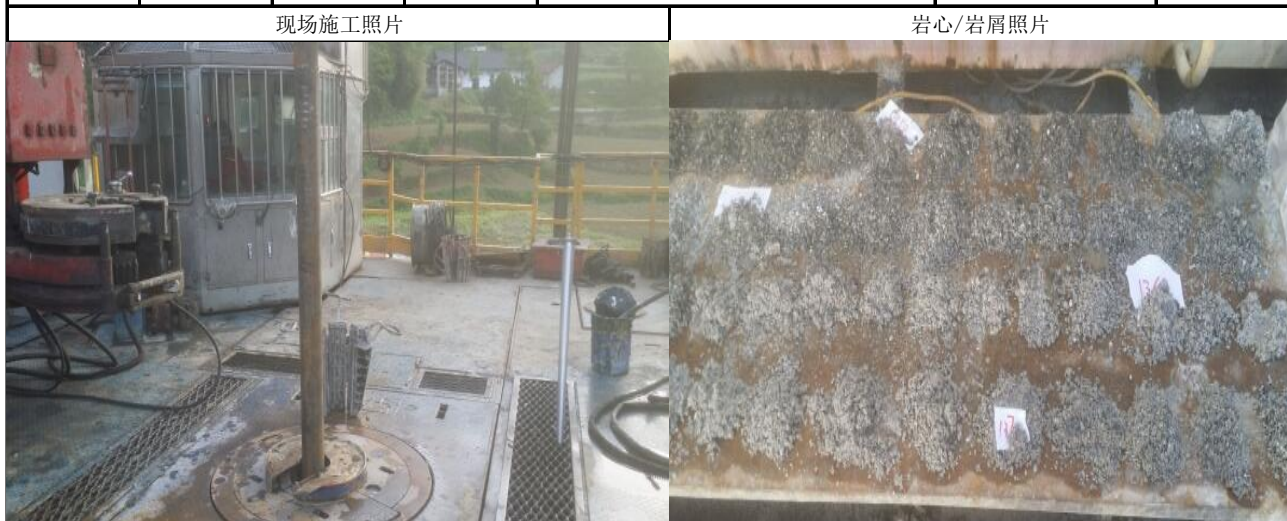

汇报人：宋腾 陈科

日期：2016年5月16日

