



尼1井钻探工程施工日报

(时间: 2016年07月17日 19:00 至 2016年07月18日 19:00 天气: 阴)

工程名称: 尼玛盆地地质调查钻井工程

实施单位: 中国地质调查局油气资源调查中心


施工单位: 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

工程概况			
井点地理位置	西藏自治区那曲地区尼玛县东8公里		
构造位置	尼玛盆地	设计井深 (m)	1600
钻探目的	1. 揭示尼玛盆地古近系地层发育情况, 与周边露头及伦坡拉盆地进行对比; 2. 了解烃源岩发育情况, 揭示目的层E2n3-E2n2烃源岩有效性; 3. 了解区内的地层及储盖组合发育情况, 为进一步油气勘探评价提供基础资料。		

钻井施工情况							
施工累计天数	29		当前井深（m）		620.89	日进尺（m）	19.99
钻遇地层	牛堡组	钻具组合	Φ96mm金刚石钻具+Φ89mm钻杆+Φ89mm主动钻杆			钻头规范	Φ96mm
已钻遇地层情况	地层	第四系	牛堡组三段	/	/	/	/
	井深	150.20	620.89	/	/	/	/
	层厚	150.20	470.69	/	/	/	/
施工情况	0717.19:00—0717.23:00修钻机；0717.23:00—0718.19:00 钻进。						
泥浆性能	钻井液密度（g/cm ³ ）		1.05	含砂%		0.7	
	粘 度（s）		19	PH值		7	
	失 水（mL）		/				

录井资料							
主要岩性	砂砾岩						
荧光显示	无						
全烃 (%)	0.00						
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取心情况	钻进8个回次 (自367回次-374回次); 总进尺19.99米;			常规钻时	最大	最小	一般
					65min	30min	47min

现场照片

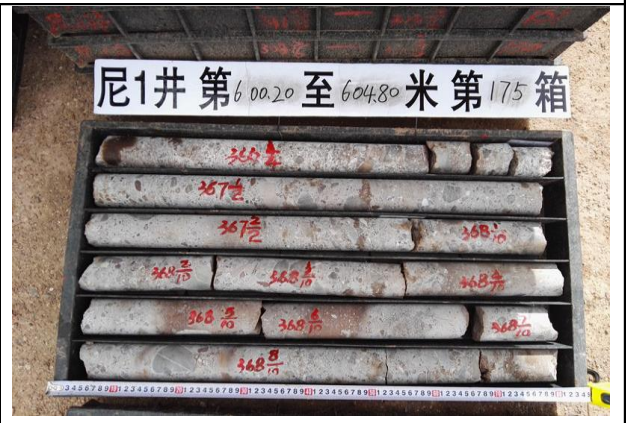

汇报人: 钟俊伟

审核: 叶久扬

日期: 2016年07月18日
