





尼1井钻探工程施工日报

(时间：2016年07月22日 19:00 至 2016年07月23日 19:00 天气：晴)

工程名称：尼玛盆地地质调查钻井工程
实施单位：中国地质调查局油气资源调查中心 施工单位：西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

工程概况							
井点地理位置	西藏自治区那曲地区尼玛县东8公里						
构造位置	尼玛盆地				设计井深（m）		1600
钻探目的	1. 揭示尼玛盆地古近系地层发育情况，与周边露头及伦坡拉盆地进行对比； 2. 了解烃源岩发育情况，揭示目的层E2n3-E2n2烃源岩有效性； 3. 了解区内的地层及储盖组合发育情况，为进一步油气勘探评价提供基础资料。						
钻井施工情况							
施工累计天数	34		当前井深（m）		757.43	日进尺（m）	27.84
钻遇地层	牛堡组	钻具组合	Φ96mm金刚石钻具+ Φ89mm钻杆+ Φ89mm主动钻杆			钻头规范	Φ96mm
已钻遇地层情况	地层	第四系	牛堡组三段	/	/	/	/
	井深	150.20	757.43	/	/	/	/
	层厚	150.20	607.23	/	/	/	/
施工情况	0722.19:00—0723.15:00钻进；0723.15:00—0723.19:00清理泥浆池。						
泥浆性能	钻井液密度（g/cm ³ ）		1.05	含砂%		0.7	
	粘 度（s）		19	PH值		7	
	失 水（mL）		/				
录井资料							
主要岩性	砂砾岩						
荧光显示	无						
全烃（%）	0.002						
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取心情况	钻进9个回次（自412回次-420回次）；总进尺27.84米；			常规钻时	最大	最小	一般
					35min	20min	26min

现场照片

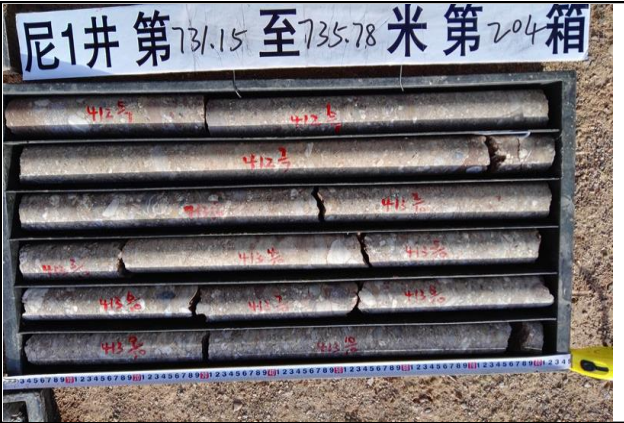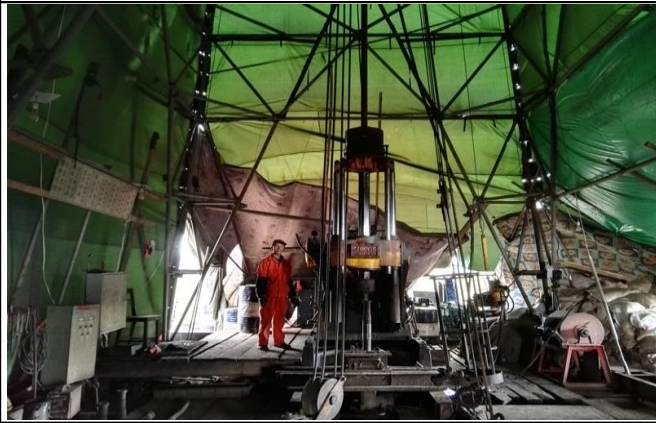

汇报人：钟俊伟 审核：叶久扬 日期：2016年07月23日
