



尼1井钻探工程施工日报

(时间: 2016年07月09日 19:00 至 2016年07月10日 19:00 天气: 晴)

工程名称: 尼玛盆地地质调查钻井工程

实施单位: 中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位: 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

工程概况


井点地理位置	西藏自治区那曲地区尼玛县东8公里		
构造位置	尼玛盆地	设计井深 (m)	1600
钻探目的	1. 揭示尼玛盆地古近系地层发育情况, 与周边露头及伦坡拉盆地进行对比; 2. 了解烃源岩发育情况, 揭示目的层E2n3-E2n2烃源岩有效性; 3. 了解区内的地层及储盖组合发育情况, 为进一步油气勘探评价提供基础资料。		

钻井施工情况

施工累计天数	21		当前井深 (m)	500.50	日进尺 (m)	23.90
钻遇地层	牛堡组	钻具组合	Φ122mm金刚石钻具+Φ115mm钻杆+Φ115mm主动钻杆		钻头规范	Φ122mm
已钻遇地层情况	地层	第四系	牛堡组三段	/	/	/
	井深	150.20	500.50	/	/	/
	层厚	150.20	350.30	/	/	/
施工情况	0709.19:00—0710.19:00钻进。					
泥浆性能	钻井液密度 (g/cm ³)	1.05	含砂%		0.7	
	粘度 (s)	19	PH值		7	
	失水 (mL)	/				

录井资料

主要岩性	棕红色砂质泥岩夹砾屑灰岩						
荧光显示	无						
全烃 (%)	/						
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	钻进15个回次 (自294回次-308回次); 总进尺23.90米;			常规钻时	最大	最小	一般
					30min	18min	21min

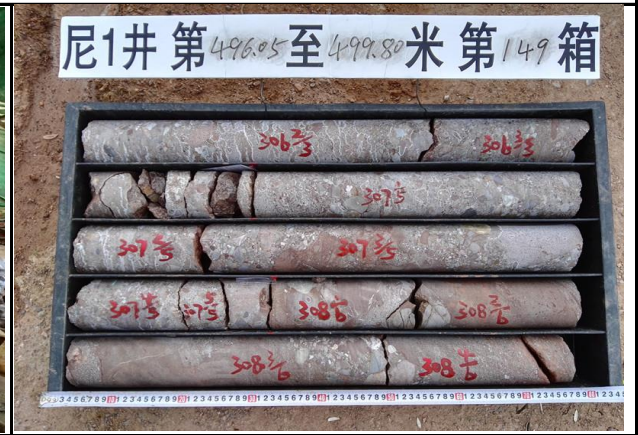

汇报人: 钟俊伟

审核: 叶久扬

日期: 2016年07月10日
