
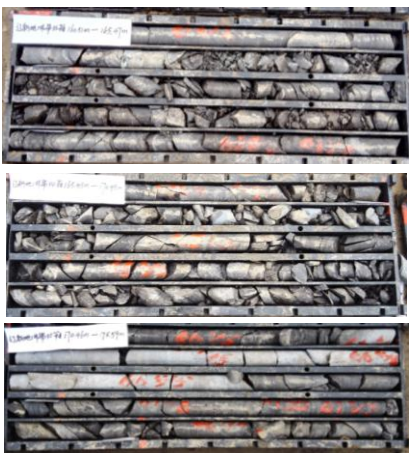
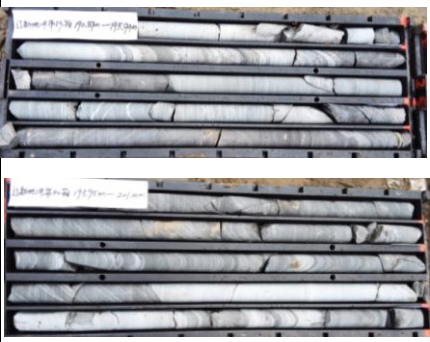


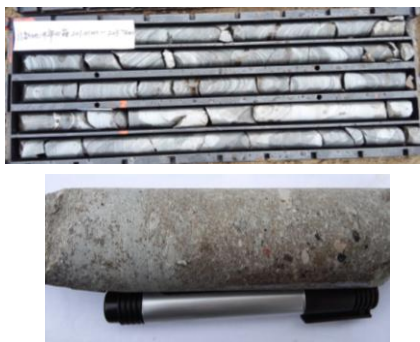

起止时间：2016年9月13日8点-2016年9月14日8点

井点地理位置		辽宁桓仁红庙子乡			构造位置		红庙子盆地		填报人
目的层段		下白垩统鹰嘴砬子组、中侏罗统侯家屯组			设计井深（m）		1500m		
钻井施工情况									
施工累计天数		7		当前井深（m）		207.08		日进尺（m）42.49	
钻遇地层				垂 深（m）				钻头规范（mm）Φ79mm	
已钻遇地层	地层	第四系		鹰嘴砬子组					
	井深	6.50		207.08					
	层厚	6.50							
施工情况		9月12日15:00-9月13日8:00，钻进85.03米，岩性为厚层泥岩、含油含砾砂岩、粉砂岩；9月12日8:00-15:00，维修钻机。							
钻井液性能				入口		出口		泥饼（mm）	
	泥浆密度（g/cm³）					1.10		粘度（s）50	
	电导率（s/m）							初切（mg/cm²）	
	温度（℃）							终切（mg/cm²）	
失水（mL）				含砂（%）				PH值8	
钻具结构		Φ79mm金刚石钻头+Φ79.5mm扩孔器+Φ71mm钻杆							
测点深度		井斜		方位				位移	
100米		89.90							
200米		89.75							
时效分析									
生产时间	纯钻进	6:00:00		扩划眼		非生产时间		事故	
	起下钻	3:30		循环钻井液				修理	
	接单根	2:30		地质循环				组织停工	
	换钻头			测井/测斜				其他情况	
	固井/下套管			试压				每甲方指令	
录井资料									
岩 性		厚层泥岩、含油含砾砂岩、粉砂岩							
孔深（m）		171.70-172.00		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）0.1500	
组分(%)		C ₁ 0.1300		C ₂		C ₃ iC ₄ nC ₄		iC ₅ nC ₅	
孔深（m）		176.10-178.40		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）1.1200	
组分(%)		C ₁ 1.0800		C ₂		C ₃ 0.0400iC ₄ nC ₄		iC ₅ nC ₅	
孔深（m）		178.60-185.30		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）6.2500	
组分(%)		C ₁ 6.0600		C ₂		C ₃ 0.1800iC ₄ nC ₄		iC ₅ nC ₅	
取心情况		进尺42.49米，岩心长度41.82米，取心率98.42%，总进尺207.08米，总岩心长度199.04米，总取心率96.12%							
显示情况									
取心钻时（min/m）		最大		8.70		最小		4.20一般6.60	
现场解吸气 含量测定实验		解吸测定井段（m）		/ / / /		岩 性		/ / / /	
辽新地1井岩心照片									
									
									
汇报人：王琳					审核人：王丹丹				
日期：2016年9月14日									
